

0330363 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 330363
Nombre: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE TACTIC
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA
 EDUCACION 2-EDUCACION PRIMARIA
Ubicación:

Departamento	Municipio
ALTA VERAPAZ	TACTIC

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: EDIN ROLANDO GUERRERO MILIAN
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
 Teléfono: 7961-2500
 Email: administracion2024@munitactic.gob.gt

Descripción:

El proyecto consiste en la AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ, la cual contempla la construcción de un módulo de tres aulas sobre una edificación existente que cuenta con módulo de gradas y terraza, se construirá rampa de acceso a personas con discapacidad, demolición de letrinas existentes y construcción de baños lavables, teniendo un total de 280 metros cuadrados de meta física del proyecto.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2024	890,000.00	676,400.00	76.00%	93.13%
		676,400.00		

0330363 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización


Descripción de la fase a financiar:

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **76.00%** al: 12/12/24

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2024	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 12-DEC-24
TOTAL :	1,150,000	890,000	827,700	676,400
Recursos internos :	1,150,000	890,000	827,700	676,400
Gobierno central :	890,000	890,000	827,700	676,400
Comunidad :				
Aporte municipal :	260,000			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

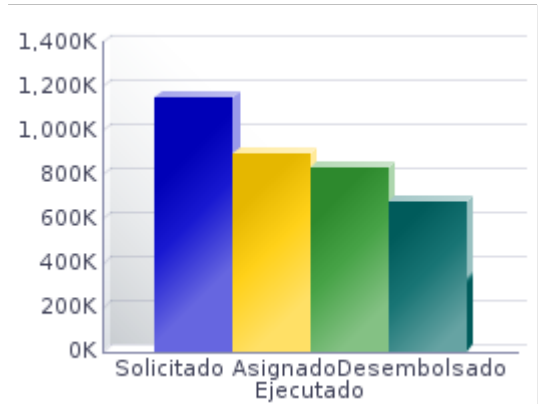

Seguimiento Físico

Avance físico: **93.13%** al: 12/12/24

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m ²	280	280
Acabados	m ²	280	280
Equipamiento	Aporte en especie	300	300
Cimentación	m ²	280	280
Obra exterior y complementaria	m ²	280	280
Puertas y ventanas	Aporte en especie	20	4
Trabajos preliminares	m ²	280	280
Fosa séptica	Aporte en especie	1	1
Pozo de absorción	Aporte en especie	1	1
Pisos	m ²	280	273
Mobiliario y equipo	Aporte en especie	200	200
Instalación Eléctrica	m ²	280	280

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s) :

Accion(es) :

0330363 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Información complementaria:
