

0145977 - CONSTRUCCION MERCADO ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 145977
Nombre: CONSTRUCCION MERCADO ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE
Institución: GOBIERNOS LOCALES
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad específica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sub-función: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ubicación:

Departamento	Municipio
QUICHE	SACAPULAS

Número de Operación de Guatecompras (NOG'S): - 3431924

Responsable del proyecto:

Nombre: juan jose tiu vicente
Cargo: alcalde municipal
Teléfono:
Email: jjtiuvicente@hotmail.com

Descripción:

consiste en la construcción de una infraestructura que servirá como espacio para los ejercicios de la transacción local..
esta obra consiste en----

0145977 - CONSTRUCCION MERCADO ALDEA PARRAXTUT, SACAPULAS, QUICHE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2015

Fecha de finalización 01/09/2015


Descripción de la fase a financiar:
EJECUCIÓN

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **95.96%** al: 04/11/2015

Información de recursos financieros:

	Programado 2015	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 04-NOV-15
TOTAL :	8,336,800	8,336,800	8,000,000
Recursos Municipales :		8,336,800	8,000,000
Situado Constitucional :			
IVA Paz :			
Ingresos Propios :			
Otros aportes :		8,336,800	8,000,000
Fuentes financiamiento :			

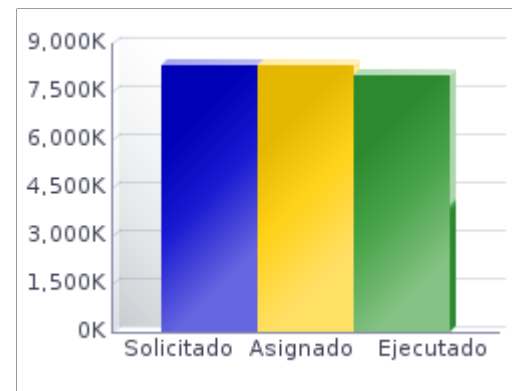

Administrador de fondos : VICTOR MENDOZA AGUSTIN

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final
02-2014	667064-4 CONSTRUCTORA EMANUEL	09/10/2014	09/08/2015

Seguimiento Físico

Avance fisico: **74.40%** al: 04/11/2015

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2015	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m ²	10,659	10,659	10,659
Cimentación	Metro	629	629	629
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamin)	m ²	2,379	2,379	2,342
Instalaciones (interior edificio)	Aporte	5	5	3
Obra exterior y complementaria	m ³	380	380	237
Puertas y ventanas	Aporte	1	1	
Trabajos preliminares	m ²	1,999	1,999	1,999

Información complementaria:
